
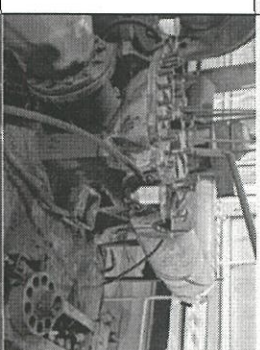
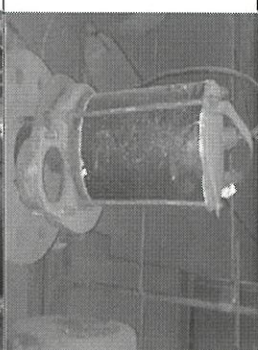



Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения областного инвестиционной программы
за 1 квартал 2025 года
АО "Кащары Вуда" - услуги по производству тепловой энергии

(Совместный приказ ДЖРЕМ МНЭ РК по Костанайской области №369-ОД от 18.12.2024г. и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №182-ОД от 20.12.2024г. - О внесении изменений в инвестиционную программу на услуги по производству тепловой энергии АО "Кащары Вуда" утвержденной совместным приказом ДЖРЕМ МНЭ РК по Костанайской области от 15.06.2023 №85-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 27.06.2023г. №94-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии АО "Кащары Вуда" на 2023-2027 годы")

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства		причины отклонения	земельные средства					бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность		места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото*, видеосъемки*	сроки исполнения	
			план	факт	план	факт	план	факт		отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт				отклонение
1	Приобретение и установка насоса Делфт D250-510B с электродвигателем	шт	1	-	26 601,1	-	26 601,1	-	26 601,1	Начало работ планируется по завершению отопительного сезона 2024-2025 гг.									Главный корпус теплоцентра		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЦ на 2025 год	
2	Приобретение и установка электронасоса ПНОМ 25-20	шт	4	-	705,7	-	705,7	-	705,7	Начало работ планируется по завершению отопительного сезона 2024-2025 гг.									Главный корпус теплоцентра		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЦ на 2025 год	
3	Приобретение и установка насоса К100-65-200 с двигателем ЭМКВТ 3000 об/мин	шт	3	-	2 041,4	-	2 041,4	-	2 041,4	Начало работ планируется по завершению отопительного сезона 2024-2025 гг.									Главный корпус теплоцентра		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЦ на 2025 год	
4	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпиточной установки	км	0,199	-	35 545,9	-	35 545,9	-	35 545,9	Начало работ планируется по завершению отопительного сезона 2024-2025 гг.									Теплотрасса		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЦ на 2025 год	
Всего на 2025 год			3	-	64 894,1	-	64 894,1	-	64 894,1													

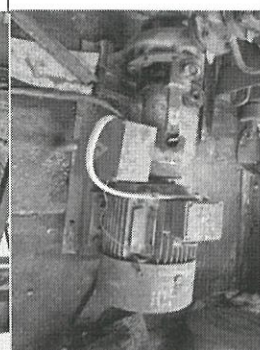

(Handwritten signature)

Г.А. Литовченко
(Ф.И.О., подпись, дата)
