

2026 жылғы 3 тоқсан бойынша
субъектімен инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы
табиғи монополия субъектісінің ақпараты

"ССКӨБ" АҚ филиалы - "Электр станциясының" жылу энергиясын өндіру бойынша қызметтері

(2022-2026 жылдарға "Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі" акционерлік қоғамының Рудный қ. жылу энергиясын өндіру қызметтеріне арналған инвестициялық бағдарламаны бекіту туралы" ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 31 тамыздағы №156-НҚ және Қостанай облысы әкімдігінің Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 2021 жылғы 06 қыркүйектегі №137-НҚ бірлескен бұйрығы)


№	Инвестициялық бағдарлама (жоба) іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																нысандардың орналасқан жері	фото -, бейнетүсірілім қосымшасымен орындау кезеңдері	орындау мерзімі
			Саны		Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		меншікті қаражат				қарыз қаражаты				бюджет қаражаты		реттелмейтін (өзге) қызмет				
			жоспар	жедел деректер	жоспар	жедел деректер	жоспар	жедел деректер	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	жедел деректер	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	жедел деректер	жоспар	жедел деректер			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Барлығы 2026 жылға				732 975,13	-	732 975,13	-	- 732 975,13		-	-	-	-	-	-	-	-			
	Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу				391 876,43	-	391 876,43	-	- 391 876,43		-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. № 3 ст. ПТВМ-100 су жылыту қазанын күрделі жөндеу.	дана	1	-	391 876,43	-	391 876,43	-	- 391 876,43	Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда	-	-	-	-	-	-	-	-	Қазандық цехы		Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда
	Турбиналық цехтың негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу.				49 673,42	-	49 673,42	-	- 49 673,42		-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Турбиналық цехтың негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №6 ст. К-63-90 турбоагрегатын күрделі жөндеу	дана	1	-	49 673,42	-	49 673,42	-	- 49 673,42	2026 жылға арналған жабдықты жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау	-	-	-	-	-	-	-	-	Турбиналық цех		2026 жылға арналған жабдықты жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау
	Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу				95 260,16	-	95 260,16	-	- 95 260,16		-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Электр цехының жабдықтарын күрделі жөндеу. С/қ 1-2 секциясының РУ-0,4 кВ электр жабдықтарын күрделі жөндеу	дана	1	-	95 260,16	-	95 260,16	-	- 95 260,16	Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда	-	-	-	-	-	-	-	-	Электр цехы		Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда
	Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу				150 144,26	-	150 144,26	-	- 150 144,26		-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу. А, Б, В тармақтың құл құбырын күрделі жөндеу	м	3861	-	150 144,26	-	150 144,26	-	- 150 144,26	2026 жылға арналған жабдықты жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау	-	-	-	-	-	-	-	-	Жалпы станциялық жабдық		2026 жылға арналған жабдықты жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау
	Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу				46 020,86	-	46 020,86	-	- 46 020,86		-	-	-	-	-	-	-	-			
5	ЖЭО. Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. ОКЦ. Қайта тиегіш кранның кран жолдарын күрделі жөндеу, тіркеу № П-1059р - 400м	м	400	-	37 460,96	-	37 460,96	-	- 37 460,96	Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда	-	-	-	-	-	-	-	-	Ғимараттар мен құрылыстар		Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда
6	Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Көмірді түсіру эстакадасының металл құрылымдарын күрделі жөндеу (132м).	м	132	-	8 559,90	-	8 559,90	-	- 8 559,90	Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда	-	-	-	-	-	-	-	-	Ғимараттар мен құрылыстар		Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда

"ССКӨБ" АҚ Бас директоры

Күні " 28 " 09 2026 жыл

Рыженков К.С.

С.В. Кузьменко
МО (Т.А.Ө., қолы, күні)




Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) факті	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) факті	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету, %	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Шығындар баптары бойынша соманы төмендету, мың теңге	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Шикізатты, материалдарды, отынды, энергияны тұтыну нормаларын заттай түрде төмендету	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген

* жөндеу жұмыстарын жыл соңына дейін жүргізу жоспарланған, тиімділік көрсеткіштері жыл қорытындысы бойынша көрсетілетін болады

"ССКӨБ" АҚ Бас директоры

Күні " 18 " 09 2026 жыл

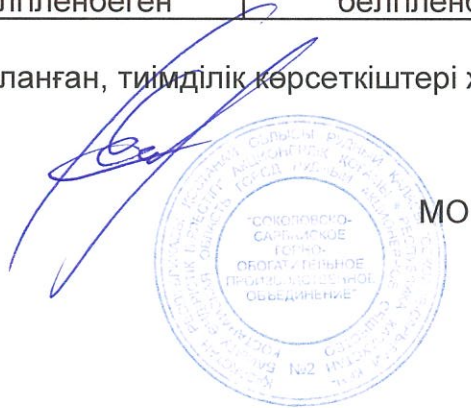

МО

С.В. Кузьменко
(Т.А.Ә., қолы, күні)
